

“点亮中国偏乡”重庆万州项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2022年03月12日



重庆万州项目开展情况

2021年1月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，重庆市万州区德立社会工作服务中心经过前期的摸底调查筛选了5所乡村学校。经初步筛选确定5所拟捐赠学校，泉水基金会指导学校对晚自习教室、老师办公室进行测量和拍照，采集了5所学校，共71间晚自习教室、1间老师办公室照明数据。

一、项目开展

为落实项目学校的需求情况，泉水基金会与重庆市万州区德立社会工作服务中心根据“点亮中国偏乡”项目捐赠条件对学校照明情况进行线上协助开展，根据学校提供的学校信息数据，综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸

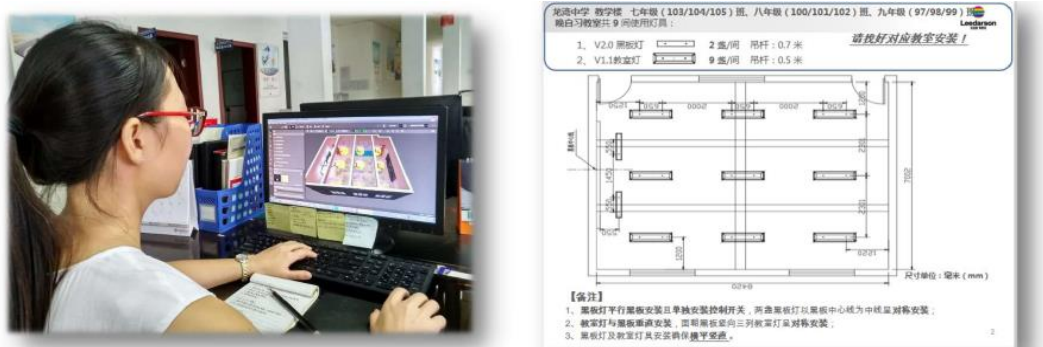


图2 捐赠协议



2021年2月26日，泉水基金会与重庆市万州区教委、重庆市万州区德立社会工作服务中心签订了三方协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具到各个学校。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指导，

及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收

2022年03月07日泉水基金会同重庆市万州区教委及德立社会工作服务中心对5所学校进行了实地验收。对长滩初级中学、白土初级中学、高升学校、国家学校、岩口复兴学校存在的灯具安装问题基金会进行了书面反馈，项目学校在规定时间内按照要求完成了整改，汇总如下：



▲长滩学校合影

序号	存在问题	整改建议	完成情况
1	九（1）班右侧黑板灯吊杆不垂直黑板灯	调整黑板灯吊杆垂直黑板灯	现场完成
2	八（1）班右侧黑板灯线未固定	黑板灯接线固定	现场完成
3	八（2）班右侧黑板灯线未固定	黑板灯接线固定	现场完成

▲ 表1 长滩初级中学验收问题及整改要求



▲白土初级中学合影

序号	存在问题	整改建议	完成情况
1	现七(1)、七(4)、八(1)、八(2)、八(3)班右侧黑板灯吊杆不垂直灯体	调整黑板灯吊杆垂直黑板灯	3月20日完成
2	现九(2)班右侧黑板灯灯杯未套好	套装到位	3月20日完成
3	现七(2)、九(7)班中间跨梁教室灯吊杆不垂直于灯体	重新定位天花板吊杆位置,调整吊杆垂直黑板灯	3月20日完成

▲表2 白土初级中学验收问题及整改要求



▲高升学校合影

序号	存在问题	整改建议	完成情况
1	现三（1）班中间教室灯吊杆与灯体不垂直	教室灯吊杆在天花板上的位置重新定位	3月16日完成
2	现四（2）、五（1）班和办公室多个教室灯灯杯未套好	套装到位	3月16日完成

▲表3 高升学校验收问题及整改要求



▲国家学校合影

序号	存在问题	整改建议	完成情况
1	现五（1）班黑板灯吊杆不垂直灯体	调整黑板灯吊杆垂直黑板灯	3月17日完成

▲ 表 4 国家学校验收问题及整改要求



▲复兴学校合影

序号	存在问题	整改建议	完成情况
1	现六（1）、八（4）班黑板灯吊杆不垂直于灯体	调整黑板灯吊杆垂直黑板灯	3月20日完成
2	现四（1）、四（2）、七（2）左侧黑板灯灯杯未套好	套装到位	3月20日完成
3	16间晚自习教室前2盏教室灯未与后面教室灯保持竖直	现有两间闲置教室灯拆后安装到14间晚自习教室使用	3月20日完成

▲ 表 5 复兴学校验收问题及整改要求

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在重庆市万州区项目学校的顺利开展，离不开重庆市万州区教委和德立社会工作服务中心对项目的重视，再次感谢重庆市万州区教委和德立社会工作服务中心的支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”重庆市万州区项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，重庆市万州区项目开展整体评定等级为 A（优）。
