

「点亮中国偏乡」湖南衡阳（县）项目

总结与评估报告

报告人：厦门市立达信泉水慈善基金会

时 间：2023年03月28日



湖南衡阳县项目开展情况

2022年5月，根据厦门市立达信泉水慈善基金会提供的实施方案，湖南省衡阳县教育局经过前期的摸底调查筛选了10所乡村学校。经初步筛选确定8所拟捐赠学校，立达信泉水慈善基金会指导学校对晚自习教室、老师办公室进行测量和拍照，采集了8所学校，共63间晚自习教室、9间老师办公室照明、38间学生宿舍数据。

一、项目开展

为落实项目学校的需求情况，立达信泉水慈善基金会与衡阳县教育局及衡阳县积善志愿者协会根据「点亮中国偏乡」项目捐赠条件对学校照明情况进行线上协助开展，根据学校提供的学校信息数据，综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信 LED 全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸

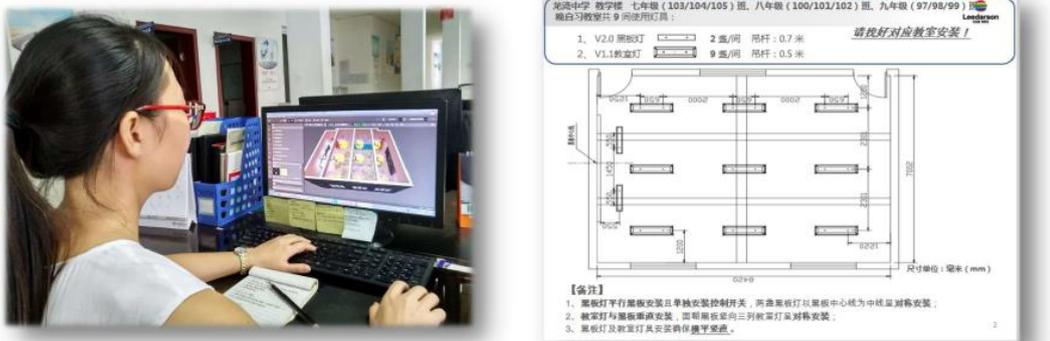


图2 捐赠协议



2022年6月18日，泉水基金会与衡阳县教育局及衡阳县积善志愿者协会签订了三方协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具到各个学校。学校在收到灯具后在暑假期间内完成了灯具安装工作，安装过程中立达信泉水慈善基金会给予了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收

2023年03月27日-28日，立达信泉水慈善基金会同衡阳县教育局及衡阳县积善志愿者协会对8所学校进行了实地验收及2所以前开展的学校进行了走访，了解灯具使用情况。对岷山中学、关市盘石完小、金兰贺市中学、金兰石坳学校、曲兰桐梓中学、曲兰中学、集兵湘江中学、三湖中学存在的灯具安装问题基金会进行了书面反馈，项目学校在规定时间内按照要求完成了整改，汇总如下。

第1站：岷山中学



表1 岷山中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	整改情况	整改完成时间
1	九（2）班第二列最后一盏教室灯驱动上面有胶	取下胶带，以免影响美观	胶带已清理	3月31日
2	九（3）班中间两盏教室灯开关坏了	尽快维修好开关	已维修	4月2日
3	空置的教室第一盏黑板灯灯杯未套好	套装到位	灯杯已套好	3月31日



图3 胶带已清理



图4 灯杯已套好


第2站：盘石完全小学



表 2 盘石完全小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	整改情况	整改完成时间
1	一年级第3 盏黑板灯/三年级第2 盏黑板灯吊杆不垂直灯体	调整黑板灯吊杆垂直黑板灯	已调整黑板灯位置	3月31日
2	五年级黑板灯灯杯未套好	套装到位	灯杯已套好	3月31日

第3站：贺市中学

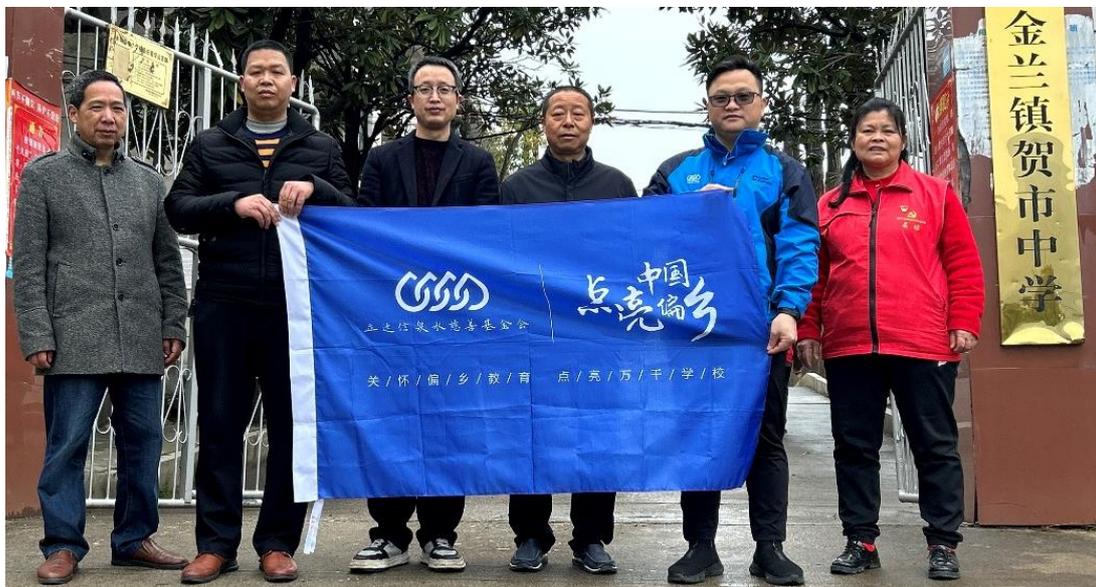

安装标准，无需整改

第4站：石坳学校

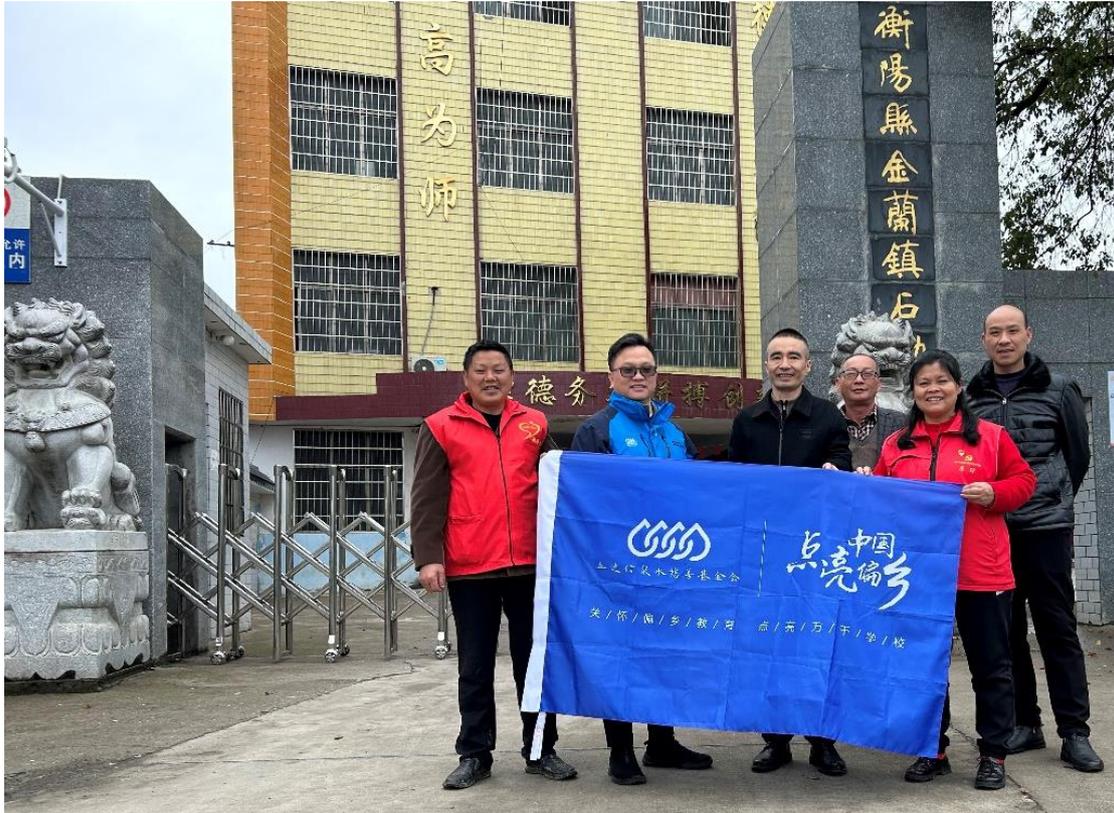


表 3 石坳学校验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	整改情况	整改完成时间
1	一年级 2 班第 2 盏黑板灯未和其他两盏在一条水平线	按图纸调整黑板灯位置	已调整在一条水平线	4 月 2 日
2	三年级 1 班一盏黑板灯不亮	先检查线路问题	已接通线路，正常发亮	3 月 31 日

第5站：桐梓中学



表 4 桐梓中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	整改情况	整改完成时间
1	所有教室黑板灯未按图纸安装，只安装2盏0.9米黑板灯（图纸设计3盏）	按图纸要求整改黑板灯数量及尺寸	已按图纸整改黑板灯数量	4月10日
2	所有教室黑板灯开关与前面4盏教室灯共用一个开关，不便于黑板灯控制	按图纸要求，安装单独开关控制黑板灯	黑板灯开关已单独控制	4月10日
3	项目纪念牌匾未见到	找出纪念牌匾	已找到	3月30日

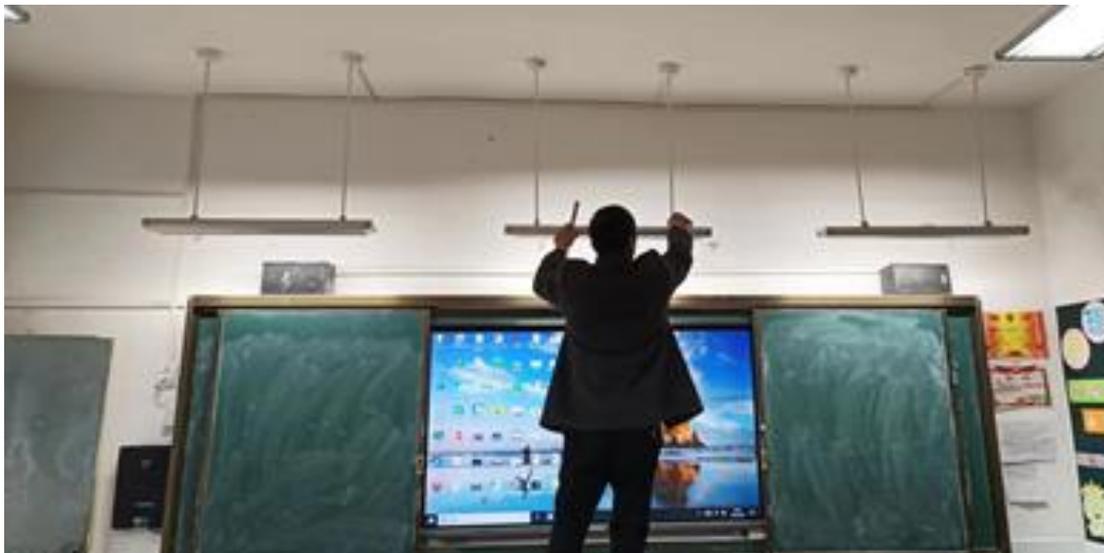


图 9 已按图纸每间黑板灯设计 3 盏


第6站：曲兰中学



表 5 曲兰中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	整改情况	整改完成时间
1	245 班/246 班/247 班/252 班/254 班/256 班均有个别灯杯未套好	套装到位	灯杯已套好	3月31日
2	252 班/255 班各有一盏黑板灯不亮	先检查线路问题	线路松动，已解决	3月31日

第7站：集兵潮江中学

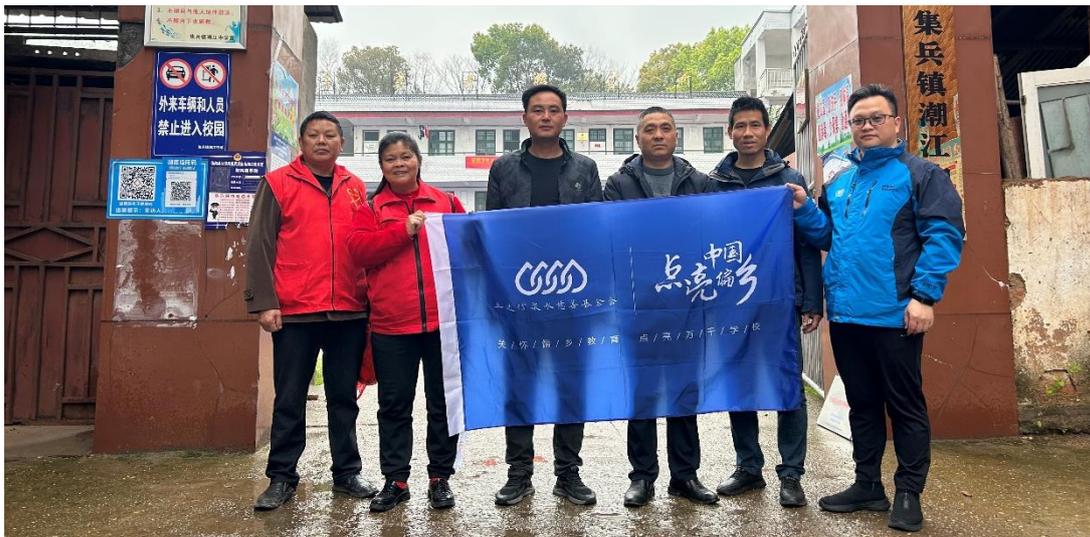

安装标准，无需整改。

第 8 站：三湖中学

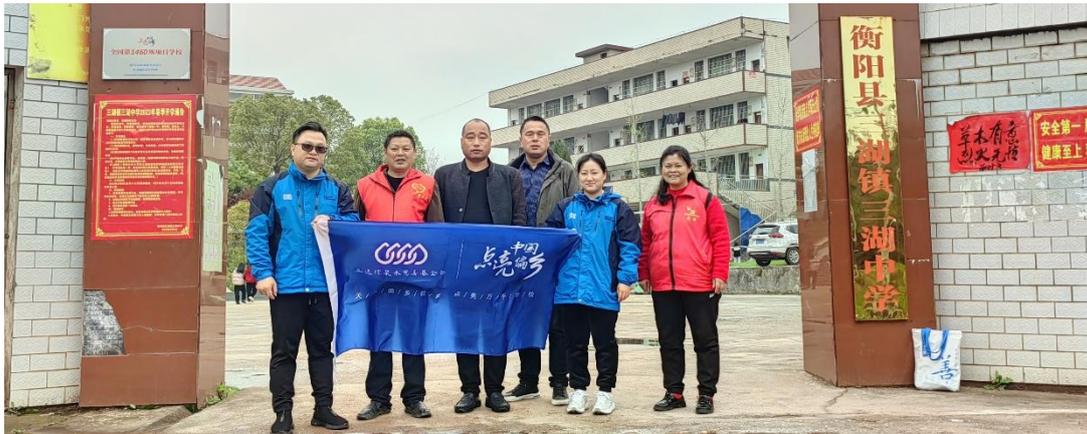


表 5 三湖中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	整改情况	整改完成时间
1	151 班/150 班/747 班/148 班/二楼办公室 风扇与教室灯有交叉，课桌面会有晃影	适当抬高或移动风扇位置， 使其不会与灯具交叉	已按要求移动 风扇位置	4 月 10 日



图 12 风扇位置已调整



图 13 风扇位置已调整

三、项目评估结果

立达信泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在湖南衡阳县的顺利开展，离不开衡阳县教育局及衡阳县积善志愿者协会对项目的重视，再次感谢湖南衡阳县教育局及衡阳县积善志愿者协会的支持与帮助。经验收总结，「点亮中国偏乡」衡阳县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，湖南衡阳县项目开展整体评定等级为 A（优）。
